

Nasjonalt Vitenarkiv Styringsgruppemøte

01.02.2022


Terje Hellesvik




Prosjektnavn:	Nasjonalt Vitenarkiv (NVA)	Oppsummering		
Ansvarlig virksomhet:	Sikt	Prosjektet kjører pilot med minimumsfunksjonalitet. Det er foreløpig tre institusjoner som har lagt inn publikasjoner i produksjon. Prosjektet kan ikke ta inn nye institusjoner før nytt personregister er på plass. Det er opprettet en ekstern testgruppe (vår referansegruppe) som har tilgang til en testinstans. Prosjektet har fått på plass automatisk bygging, utrulling og testing (DevOps). Ny funksjonalitet rulles ut fortløpende. Siste utrulling i produksjon er 1. desember.		
Prosjekteier:	Frode Arntsen			
Prosjektleder:	Terje Hellesvik			
Rapportdato	28.01.2022			
	Forrige	Nå	Trend	Områdestatus
Fremdrift				Dagens Sentralimport må justeres mer enn forutsatt. NVA har tatt i bruk BARE som personregister, men har besluttet å ta i bruk Cristin sitt personregister. Dette påvirker framdrift. Generell lav framdrift som i hovedsak skyldes manglende kompetanse/kapasitet på sentrale områder.
Økonomi				Prosjektet har til sammen ? millioner for å ferdigstille prosjektet i 2022.
Ressurser				Prosjektet sitter nå med et utviklingsteam med variabel kompetanse som må utvikles videre for å sikre gode leveranser.
Kvalitet				Det er avsatt en egen ressurs til å jobbe med automatiske tester. Alle tester kjører nå i sky. Det lages en testrapport som følges opp daglig. Det er ikke meldt om problemer i produksjon.
Avhengigheter				Masterdatakilder for prosjekt, person og organisasjon som ivaretas av TILDE-prosjektet blir ikke ferdig i år. NVA blir avhengig av prosjekt, person, organisasjon som det ligger i Cristin-databasen. Avhengig av Kanalregisteret. Prosjektet har ukentlige møter for å få på plass innmelding av nye kanaler.
Risiko				Noe mangelfulle kompetanse/erfaring i utviklingsteamet for å få full hastighet. Får mer hjelp av dagens Cristin sekretariat til hjelp til med produkteier-utredning.

Økonomistatus

AKKUMULERT BUDSJETT OG REGNSKAP

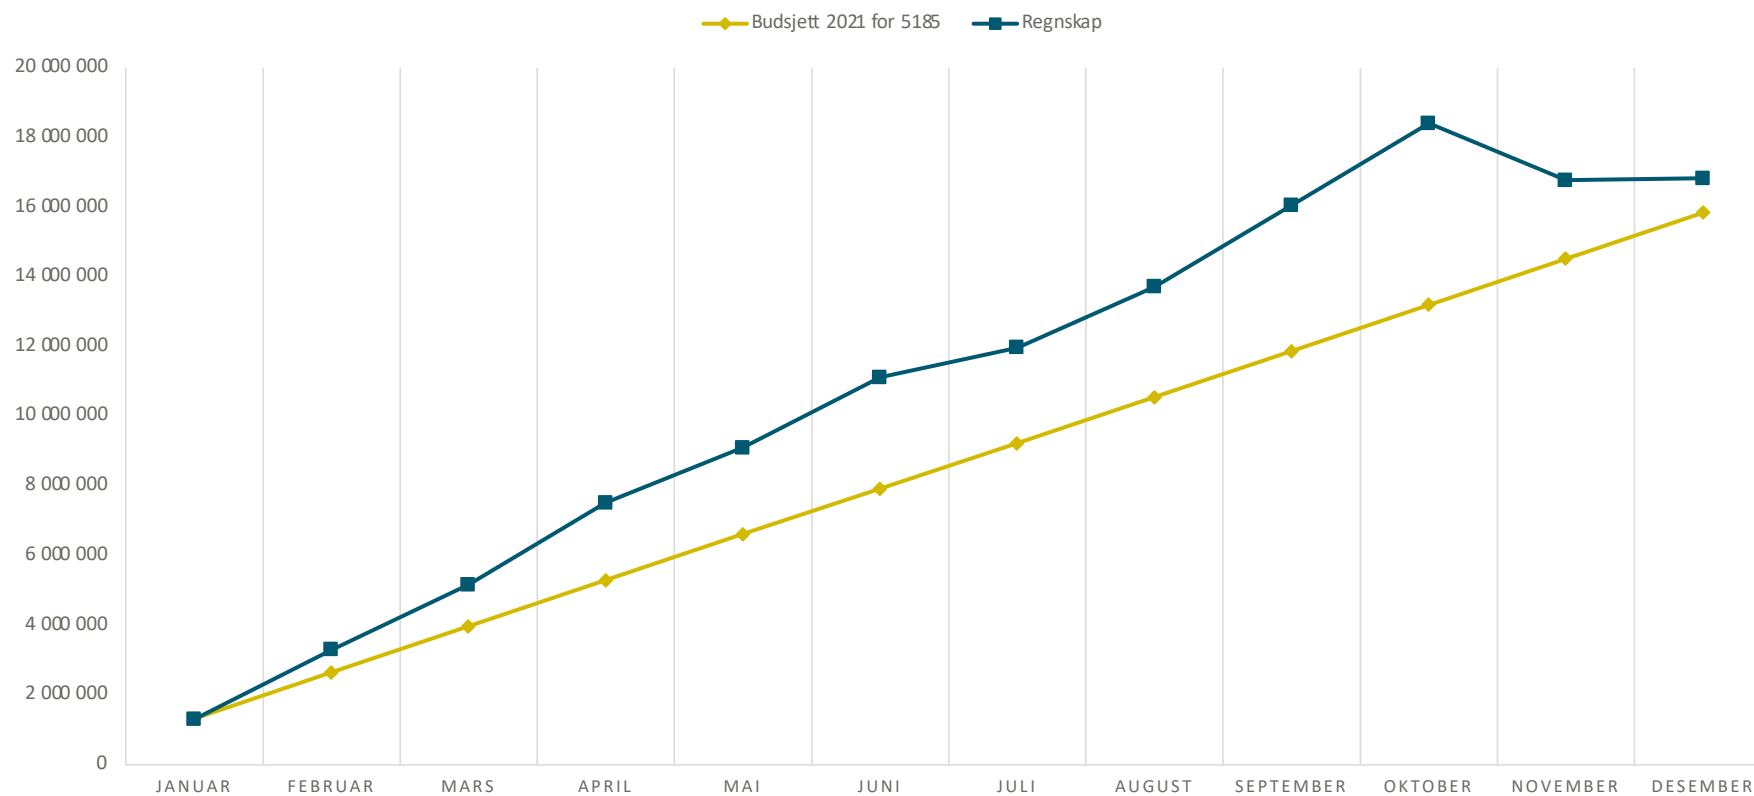

Risikovurdering

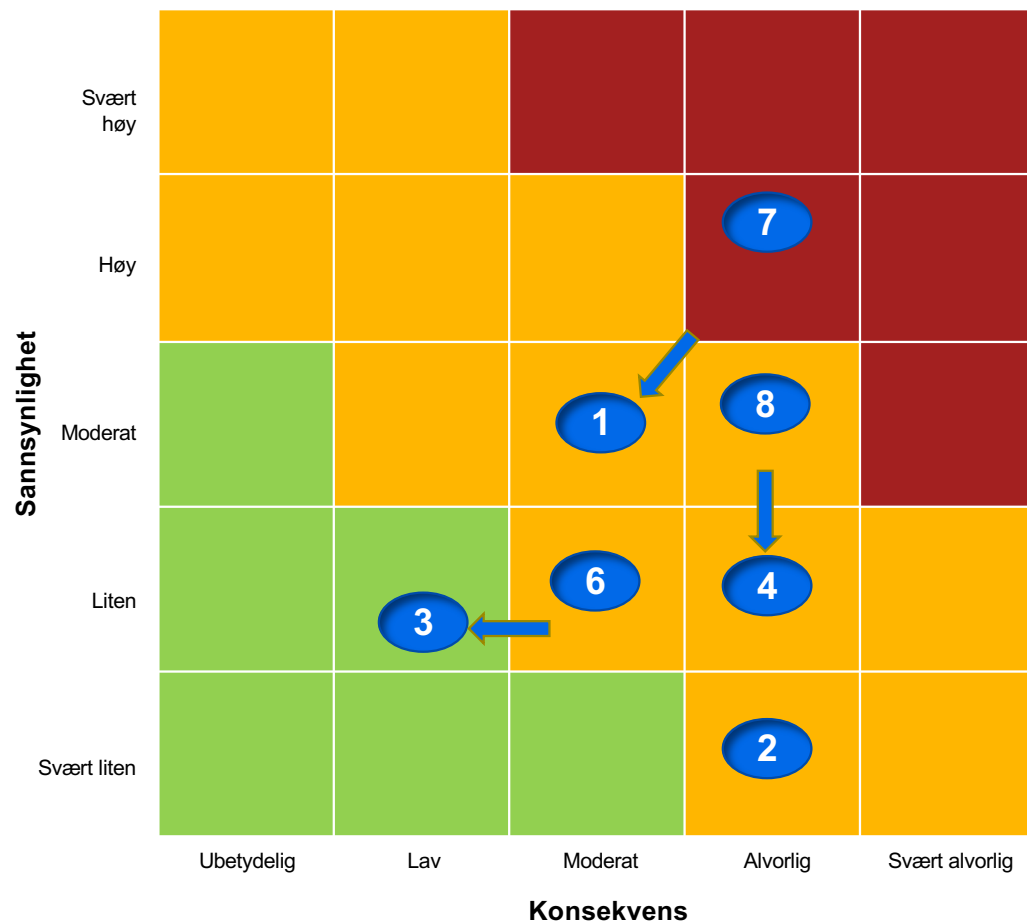

	Risikoelementer	Tiltak
1	For liten kapasitet på produkteierne	Avlaste produkteierne fra annet arbeid. Involvere Seksjon for forskningsstøtte i utredningsarbeid.
2	Ikke mulig å registrere brukere/forfatter i CRIS/NVA	Få hjelp av Seksjon for forskningsstøtte til å definere prosess for personhåndtering i CRIS/NVA. Finne personer fra Cristin-miljøet som kan hjelpe til å implementere API'er for ny prosess.
3	Kvalitet og omfang på migrering av Cristin-resultat	Avklaringer, involvere Cristin databaseutviklere og arkitektgruppen. Gjør proof-of-concept
4	Forsinkelser i implementasjon av Sentralimport i CRIS/NVA	Utrede, justere eller nyutvikle løsning for import av publikasjonsdata
5	Ny NVI-prosedyre blir ikke avklart tidlig nok	Tett oppfølging av utredningen. Utrede mulige alternativer til full NVI-prosedyre
6	DUCT/Tableau får ikke de riktige data fra CRIS/NVA	Jobbe tett med Seksjon for forskningsstøtte. Gjør enkel proof-of-concept
7	Manglende framdrift på utvikling	Se på kompetansetiltak. Gjør endringer i arbeidsprosesser.
8	Cristin-API slutter å fungere for utlesing av resultat	Avklare omfang med Tech-lead.

Leveranseoversikt – Fase 7 : 01.01.2022 – 30.06.2022

Leveranse	% fullført	Forfallsdato	Ny dato	Kommentar
Registreringstyper fra Brage	70	31.05.2022		Lage skjermbilder for alle registreringstyper som man ønsker å migrere fra Brage
Støtte for NVI registreringstyper	100	15.01.2022		Lage skjermbilder for alle registreringstyper som skal gi uttelling for NVI
Støtte for registreringstyper fra Cristin	70	31.05.2022		Lage skjermbilder for alle registreringstyper som man ønsker å migrere fra Cristin
Ta i bruk Cristin-personregister	60	28.02.2022		Ta i bruk Cristin sitt personregister for personer og forfattere
Håndtering av personer	10	15.03.2022		Lag skjermbilder for å håndtere personer som skal ha tilgang til innlogging og forfatterregisteret. Dette er skjermbilder som finnes i dagens Cristin-løsning
Støtte for pålogging med MinID	0	28.02.2022		Støtter i dag kun Feide. Vil støtte MinID. Vurder mulighet for HelseID
Opprette og endre prosjekt	10	28.02.2022		Lag skjermbilder for å opprette og endre prosjekt. Bruk Cristin sitt prosjekt-API
Godkjenning av metadata og fil	20	31.03.2022		Lage skjermbilder slik at kurator kan godkjenne metadata og fil/lisens før publisering
Registratorskifte	5	31.03.2022		Lage skjermbilder slik at det er mulig med å skifte eier på et resultat
Kunstnerisk utviklingsarbeid	10	31.05.2022		Lage skjermbilder for Kunstnerisk utviklingsarbeid
Støtte for forskningsdata	10	15.03.2022		Støtte for registrering av statisk forskningsdata og DMP
Metadata for indeksering	50	28.02.2022		Tilrettelegge metadata slik at crawler ala Google finner innholdet
Sentralimport i NVA	10	15.04.2022		Lage skjermbilder for sentralimport i NVA. Endre dagens Sentralimport slik at den fungerer mot NVA
NVI kontroll og godkjenning	10	30.04.2022		Lag skjermbilder for godkjenning av resultater for NVI rapportering. Støtte for å markere tvister.
Eksport til BI-modul	10	31.05.2022		Eksporter data til DUCT/Tableau for å opprettholde dagens funksjonalitet
Tilby ekstern API-tjeneste	0	30.06.2022		Tilby API for søk og uthenting av resultat, dokumentasjon av tjenesten, tildeling av API-nøkler
Utrede ny forretningsmodell NVA	20	01.03.2022		Finne ut hvordan man ønsker å brukerfinansiere NVA. Se på muligheter i AWS for å hente ut statistikk for bruk av tjenesten
Informasjons- og kursmateriell	0	30.06.2022		Lag informasjons- og kursmateriell

Leveranseoversikt – Fase 8 : 01.07.2021 – 01.10.2022

Leveranse	% fullført	Forfallsdato	Ny dato	Kommentar
Handle-server integrasjon	0	01.09.2022		Tildel handle til alle resultater hvis de ikke har en DOI
Implementere migrering av NVI-resultater	90	01.09.2022		Migrere NIV-resultater fra Cristin til NVA sine registreringstyper inkludert historikk
Implementere migrering av Cristin-resultater	60	15.09.2022		Migrere resultater fra Cristin sine registreringstyper til NVA sine registreringstyper
Implementere migrering av Brage-resultater	30	01.10.2022		Migrere resultater fra Brage sine registreringstyper til NVA sine registreringstyper
Ny NVI innsending	0	01.10.2022		Lag skjermbilder for innsending av årets NVI rapportering for institusjonen
Endre Cristin-API	0	01.10.2022		Endre de deler av Cristin API'et som skal lese data fra NVA (Resultat++)
Importer studentoppgaver	0	01.10.2022		Sette opp API i NVA og lag program for å få inn studentoppgaver fra sensursystem
Utteksling av innhold i NVA til OpenAIRE etc.	0	01.10.2022		Støtte for OAI-PMH
Databehandleravtale	10	01.10.2022		Signer databehandleravtale med all som skal ta i bruk NVA
Overvåking	30	01.10.2022		- Funksjonalitet for overvåking og varsling av oppetid - Funksjonalitet for overvåking og varsling av feilmeldinger

