

Nasjonalt Vitenarkiv Styringsgruppemøte

18.01.2021


Terje Hellesvik




Prosjektnavn:	Nasjonalt Vitenarkiv (NVA)			Oppsummering Prosjektet kjører pilot med minimumsfunksjonalitet. Det er foreløpig en kunde som har lagt inn publikasjoner i produksjon. Prosjektet jobber med en prioritert liste over institusjoner som skal bli kunder. Det er opprettet en ekstern testgruppe (vår referansegruppe) som har tilgang til en testinstans. Prosjektet har fått på plass automatisk bygging og utrulling (DevOps). Det jobbes med ny funksjonalitet som vil bli rullet ut fortløpende. I henhold til prosjektplanen ligger vi etter tidsplan. Det er satt inn tiltak for å prøve å ta igjen noe av dette (nye ressurser, endring i arbeidsprosess).
Ansvarlig virksomhet:	Unit			
Prosjekteier:	Frode Arntsen			
Prosjektleder:	Terje Hellesvik			
Rapportdato	18.01.2021			
	Forrige	Nå	Trend	Områdestatus
Fremdrift				I henhold til prosjektplanen ligger vi etter tidsplan.
Økonomi				Det gjenstår 6 mill fra midlene som ble tildelt i RNB. Det er tildelt ytterligere 10 MNOK for 2021 for ferdigstilling av prosjektet inkludert trinn 2.
Ressurser				Prosjektet sitter nå med et stabilt utviklingsteam med riktig kompetanse.
Kvalitet				Det er avsatt en egen ressurs til å jobbe med automatiske tester. Foreløpig testes kode som skal i produksjon manuelt. Det er kun en kunde i produksjon og ikke meldt om problemer.
Avhengigheter				Avhengig av Masterdatakilder for prosjekt og person.
Risiko				Fortsatt lavere framdrift enn ønsket.

Økonomistatus


AKKUMULERT BUDSJETT OG REGNSKAP

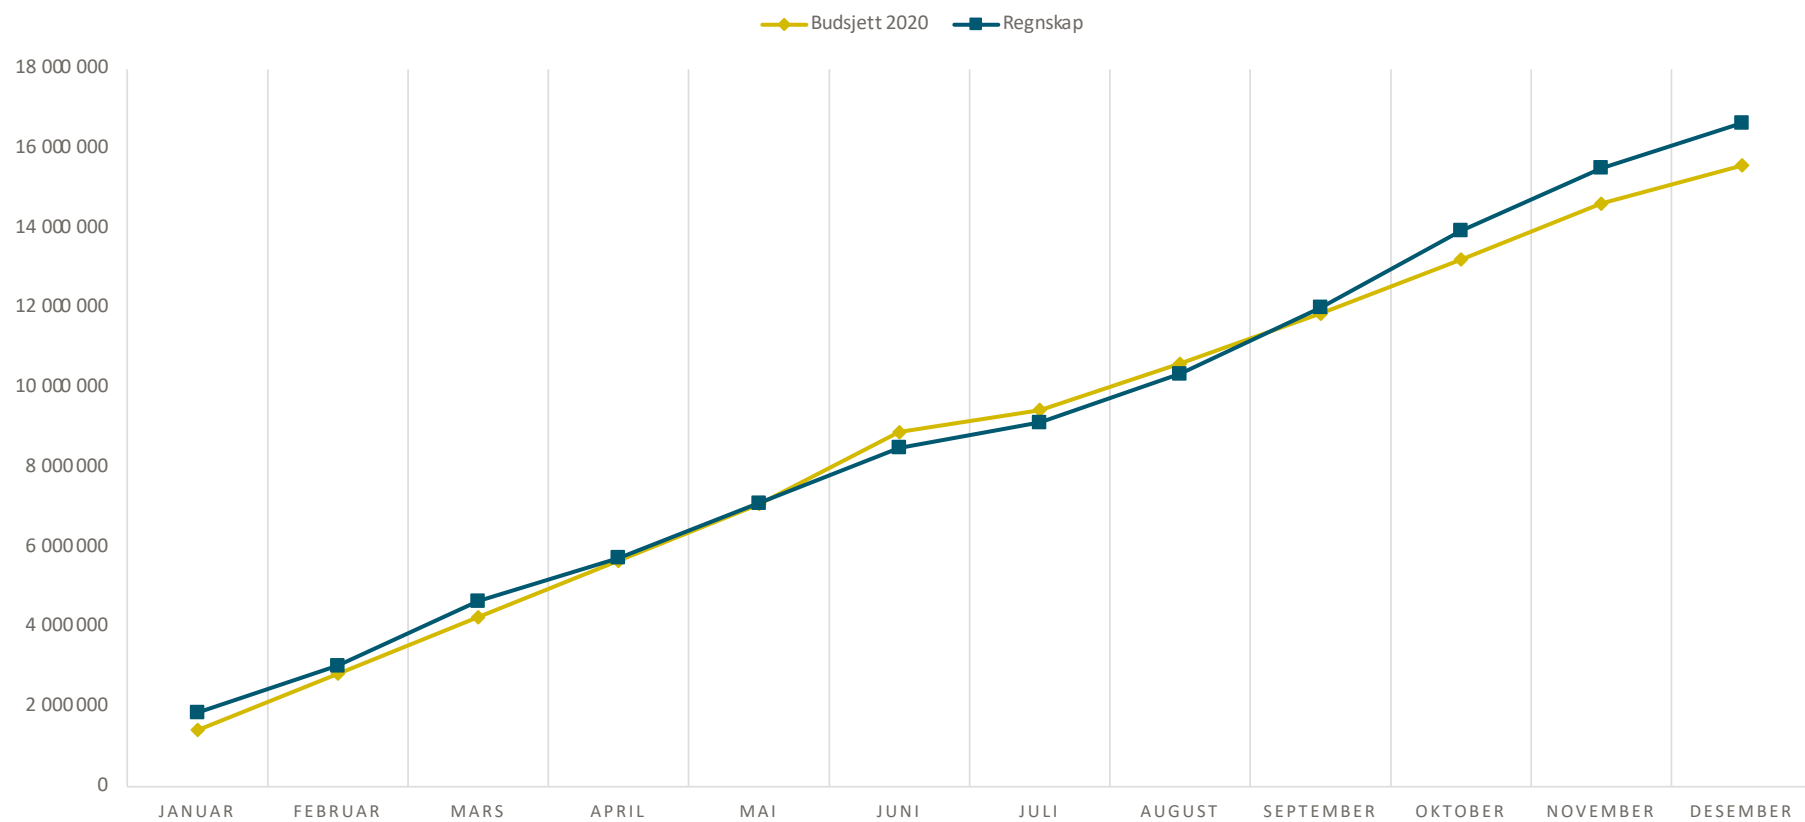

Risikovurdering

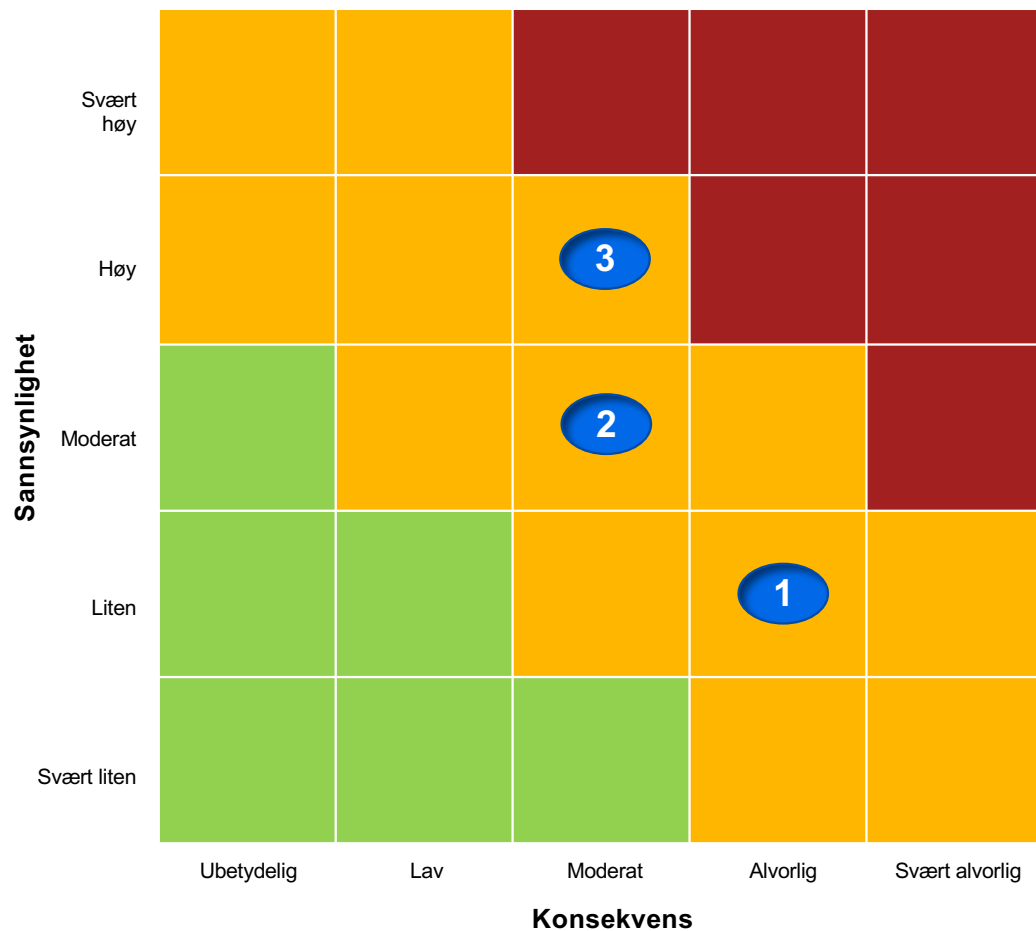

	Risikoelementer	Tiltak
1	Lav framdrift	Endre arbeidsprosess
2	Beholde egne ressurser	Skjerme, avklare internt
3	Tilgang til Cristin-ressurser	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

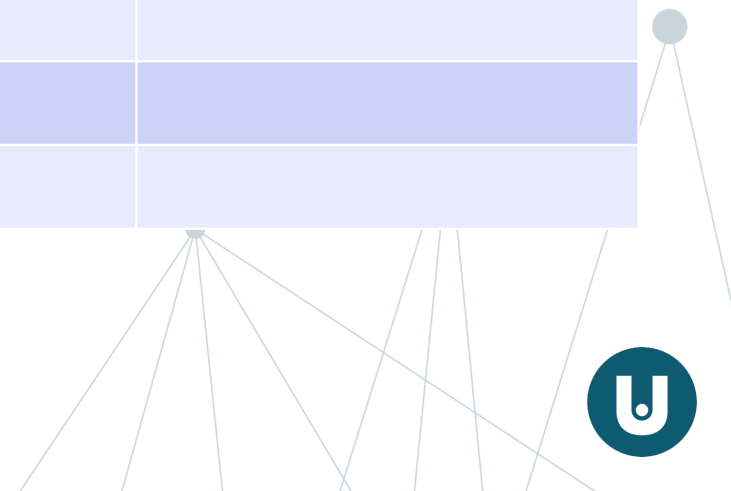

Leveranseoversikt

Leveranse	% fullført	Forfallsdato	Kommentar
Oppfølging av pilotkunder / testkunder	50	31.12.2020	Pilotkunder: Fjellhaug og HL-senteret. Oppfølging av HL-senteret uke 42/43/44 Referansegruppe: NTNU, Sintef, Nina, BI, UiO, Oslo Met, UiB. Planlagte aktiviteter uke 42/43/44.
Støtte alle registreringstyper for å kunne importere fra Brage	75	31.12.2020	Støtter nå: Publikasjon i tidsskrift, bokpublikasjon, rapport, studentoppgave, kapittel Jobbes med: Presentasjon, annet resultat
Administrasjonsskjermbilder	90	31.12.2020	Kurator: støtter arbeidsflyt for utstedelse av DOI (ikke selve utstedelsen), jobbes med brukersupport, godkjenning av publikasjoner Administrator: støtter endring av data om egen institusjon, tildeling av roller Redaktør: Avklares med referansegruppen
Støtte nok metadata til at det er mulig å gjøre NVI-rapportering for 2021 og videre	90	31.12.2020	Pågående diskusjon med Cristin-miljøet.
Opprette DOI	100	31.12.2020	
Hente publikasjoner fra ORCID	0	31.12.2020	
Skrive publikasjoner til ORCID	0	31.12.2020	
Start på program for Brage-migrering	60	31.12.2020	
Innmelding og behandling av brukerstøtte i NVA	0	31.12.2020	
Importere studentoppgaver fra eksamen- og sensursystem (Inspera)	40	31.12.2020	



Overordnede mål 2021

- Revidere dagens NVI prosess
- NVI rapportering i NVA for 2021 publikasjoner
- Publikasjoner fra Cristin og Brage er migrert til NVA
- Registrering av resultat i Cristin stoppes
- Brage-arkiv som er migrert legges ned
- Cristin API skal fortsatt fungere mot NVA API
- Prioritert Cristin-funksjonalitet flyttes til sky
- Støtte for forskningsdata som publikasjonstype
- Brukere av Cristin og Brage tar i bruk ny skybasert løsning. Starte på nedleggelse av Cristin og Brage.
- **Nytt navn på NVA! Dekke både Cris og Arkiv.**



