

Nasjonalt Vitenarkiv Styringsgruppemøte

25.10.2021


Terje Hellesvik




Prosjektnavn:	Nasjonalt Vitenarkiv (NVA)	Oppsummering		
Ansvarlig virksomhet:	Unit	Prosjektet kjører pilot med gradvis økende funksjonalitet. Det er foreløpig en kunde som har lagt inn publikasjoner i produksjon. Prosjektet kan ikke ta inn nye institusjoner før nytt personregister er på plass. Det er opprettet en ekstern testgruppe (vår referansegruppe) som har tilgang til en testinstans med ca 1 mill poster importert fra Cristin. Prosjektet har fått på plass automatisk bygging, utrulling og testing (DevOps). Ny funksjonalitet rulles ut fortløpende.		
Prosjekteier:	Frode Arntsen			
Prosjektleder:	Terje Hellesvik			
Rapportdato	22.10.2021			
	Forrige	Nå	Trend	Områdestatus
Fremdrift				Det er fortsatt uklart om hvor mye jobb som skal gjøres på Sentralimport. Planen var at Sentralimport skulle skrive til NVA istedenfor Cristin. Det kan se ut som det er ønsket om å endre prosess også. NVA har tatt i bruk Bare som personregister. Cristin sitt personregister må tas i bruk for å sikre import fra Cristin/Brage. Dette vil påvirke framdrift. Generell lav framdrift.
Økonomi				Prosjektet har til sammen 16 millioner for å ferdigstille prosjektet i 2021. Regnskapet viser høyere forbruk enn opprinnelig budsjett. Årsaken er at det er allokert flere ressurser enn budsjettet for å bedre fremdrift, uten særlig hell så langt
Ressurser				Prosjektet sitter nå med et utviklingsteam med variabel kompetanse som må utvikles videre for å sikre gode leveranser. Det er svært begrenset tilgang på godt kompetente utviklere, noe som virker begrensende på fremdrift.
Kvalitet				Det er avsatt en egen ressurs til å jobbe med automatiske tester. Alle tester kjører nå i sky. Det lages en testrapport som følges opp daglig. Det er kun en kunde i produksjon og ikke meldt om problemer.
Avhengigheter				Masterdatakilder for prosjekt, person og organisasjon blir ikke ferdig i 2021. NVA blir avhengig av prosjekt, person, organisasjon som det ligger i dagens Cristin-database. Avhengig av Kanalregisteret. Prosjektet har ukentlige møter for å få på plass innmelding av nye kanaler.
Risiko				Risiko i forhold til ukjent omfang på oppgaver. Mangler kapasitet på å sjekke omfang. Noe mangelfulle kompetanse/erfaring i utviklingsteamet for å få full hastighet.

Økonomistatus

AKKUMULERT BUDSJETT OG REGNSKAP

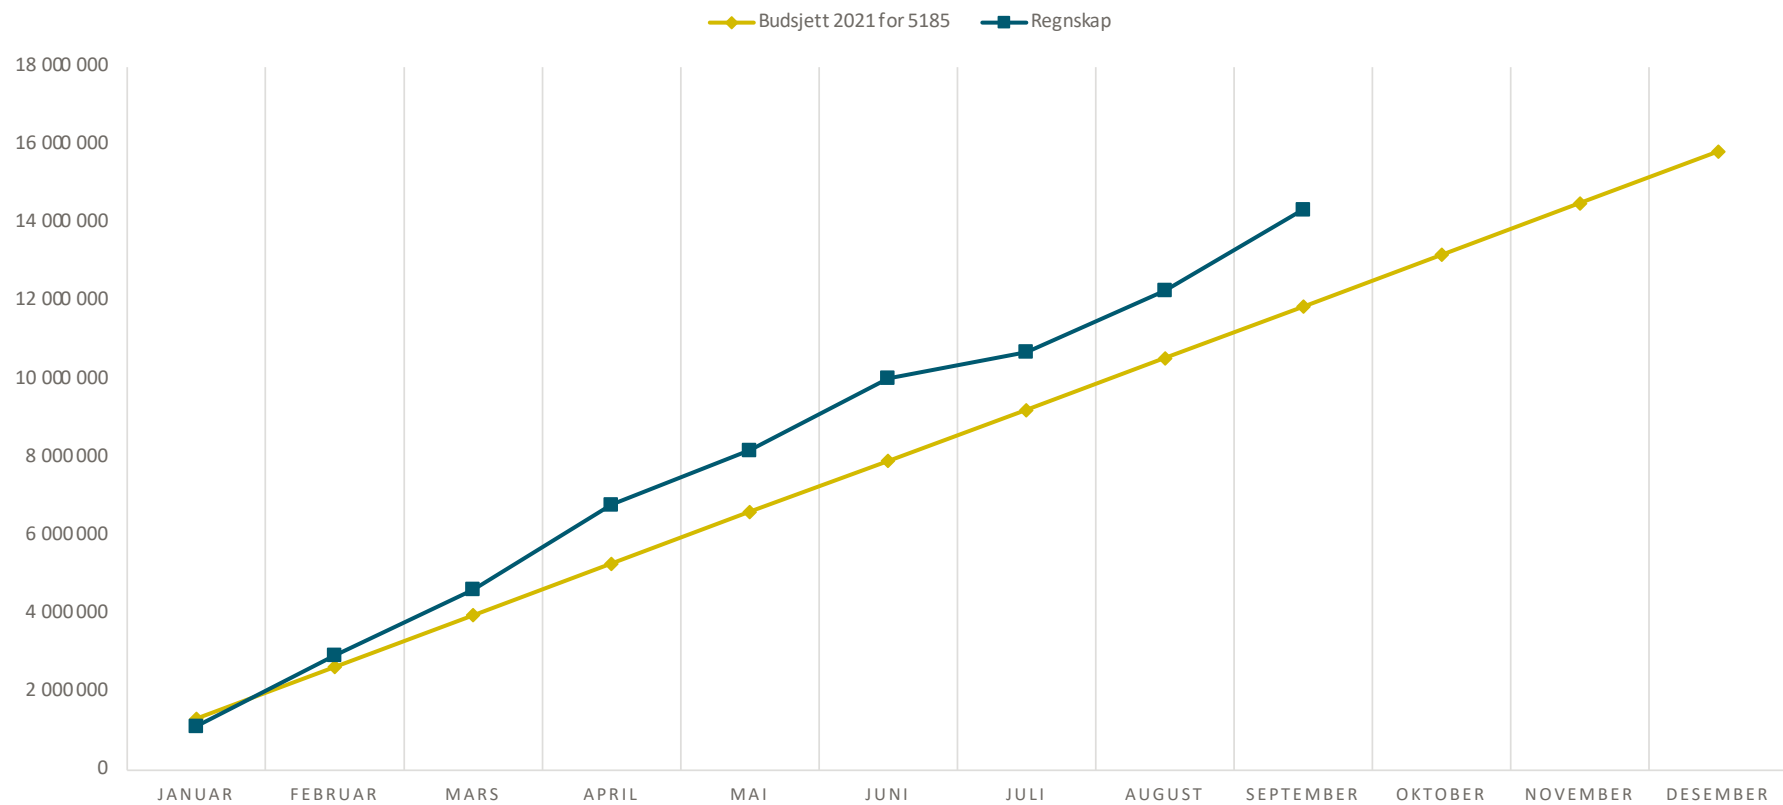

Risikovurdering

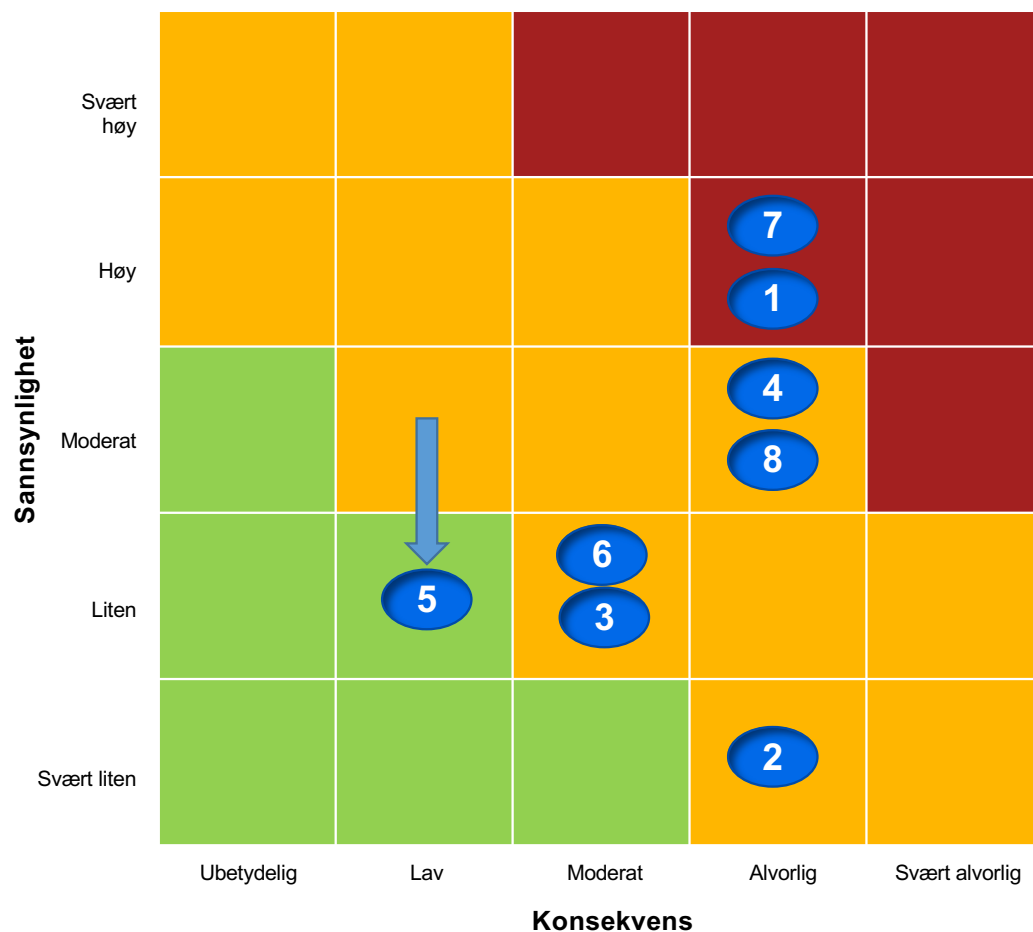

	Risikoelementer	Tiltak
1	For liten kapasitet på produkteierne	Avlaste produkteierne fra annet arbeid. Involvere Seksjon for forskningsstøtte i utredningsarbeid.
2	Ikke mulig å registrere brukere/forfatter i CRIS/NVA	Få hjelp av Seksjon for forskningsstøtte til å definere prosess for personhåndtering i CRIS/NVA. Finne personer fra Cristin-miljøet som kan hjelpe til å implementere API'er for ny prosess.
3	Kvalitet og omfang på migrering av Cristin-resultat	Avklaringer, involvere Cristin databaseutviklere og arkitektgruppen. Gjør proof-of-concept
4	Forsinkelser i implementasjon av Sentralimport i CRIS/NVA	Utrede, justere eller nyutvikle løsning for import av publikasjonsdata
5	Ny NVI-prosess blir ikke avklart tidlig nok	Tett oppfølging av utredningen. Utrede mulige alternativer til full NVI prosess
6	Brukere av DUCT/Tableau får ikke de riktige data fra CRIS/NVA	Jobbe tett med Seksjon for forskningsstøtte. Gjøre enkel proof-of-concept
7	Manglende framdrift på utvikling	Se på kompetansetiltak. Gjøre endringer i arbeidsprosesser.
8	Cristin-API slutter å fungere for utlesing av resultat	Avklare omfang med Tech-lead.

Leveranseoversikt – Fase 6 : 17.07.2021 – 31.12.2021

Leveranse	% fullført	Forfallsdato	Ny dato	Kommentar
Ta i bruk Cristin-personregister	60	15.10.2021	15.12.2021	Ta i bruk Cristin sitt personregister for personer og forfattere
Håndtering av personer	10	15.11.2021	15.01.2022	Lag skjermbilder for å håndtere personer som skal ha tilgang til innlogging og forfatterregisteret. Dette er skjermbilder som finnes i dagens Cristin-løsning
Støtte flere måter å logge på	20	15.10.2021	15.01.2022	Støtt flere måter å logge på enn Feide. Vurder mulighet for HelseID, videreføring av dagens brukernavn/passord i Cristin
Støtte for registreringstyper fra Cristin	80	01.11.2021	01.03.2022	Lage skjermbilder for alle registreringstyper som man ønsker å migrere fra Cristin
Opprette og endre prosjekt	10	01.10.2021	01.12.2021	Lag skjermbilder for å opprette og endre prosjekt. Bruk Cristin sitt prosjekt-API
Støtte for forskningsdata	10	01.11.2021		Støtte for registrering av statisk forskningsdata
Metadata for indeksering	0	01.11.2021		Tilrettelegge metadata slik at crawler ala Google finner innholdet
Sherpa/Romeo integrasjon	0	01.12.2021		Vise Sherpa/Romeo data for tidsskrifter og utgiver i forhold til lisens
Forbedre søk	10	01.12.2021		Lag mulighet for enkle søkefasetter
Tilby ekstern API-tjeneste	0	31.12.2021		Tilby API for søk og uthenting av resultat, dokumentasjon av tjenesten, tildeling av API-nøkler
Kunstnerisk utviklingsarbeid	30	31.12.2021		Lage skjermbilder for Kunstnerisk utviklingsarbeid
Migrer Cristin-resultater til ny løsning	80	01.06.2022		Migrere resultater fra Cristin sine registreringstyper til NVA sine registreringstyper

