

Nasjonalt Vitenarkiv Styringsgruppemøte

30.04.2021


Terje Hellesvik




Prosjektnavn:	Nasjonalt Vitenarkiv (NVA)			Oppsummering Prosjektet kjører pilot med minimumsfunksjonalitet. Det er foreløpig en kunde som har lagt inn publikasjoner i produksjon. Prosjektet jobber med en prioritert liste over institusjoner som skal bli kunder. Det er opprettet en ekstern testgruppe (vår referansegruppe) som har tilgang til en testinstans. Prosjektet har fått på plass automatisk bygging og utrulling (DevOps). Det jobbes med ny funksjonalitet som vil bli rullet ut fortløpende.
Ansvarlig virksomhet:	Unit			
Prosjekteier:	Frode Arntsen			
Prosjektleder:	Terje Hellesvik			
Rapportdato	27.03.2021			
	Forrige	Nå	Trend	Områdestatus
Fremdrift				Det er fortsatt uklart om hvor mye jobb som skal gjøres på Sentralimport. Planen var at Sentralimport skulle skrive til NVA istedenfor Cristin. Det kan se ut som det er ønsker om å endre prosess også. NVA har tatt i bruk Bare som personregister. Det er ønsker om å ta i bruk Cristin sitt personregister. Dette vil påvirke framdrift.
Økonomi				Prosjektet har til sammen 17 millioner for å ferdigstille prosjektet i 2021. Regnskapet viser høyere forbruk enn opprinnelig budsjett. Det er ønske om å ta igjen noe forsinkelse tidlig i året.
Ressurser				Prosjektet sitter nå med et stabilt utviklingsteam med riktig kompetanse.
Kvalitet				Det er avsatt en egen ressurs til å jobbe med automatiske tester. Foreløpig testes kode som skal i produksjon manuelt. Det er kun en kunde i produksjon og ikke meldt om problemer.
Avhengigheter				Masterdatakilder for prosjekt, person og organisasjon blir ikke ferdig i år. NVA blir avhengig av prosjekt, person, organisasjon som det ligger i Cristin-databasen. Avhengig av Kanalregisteret. De mangler fortsatt muligheter for å melde inn nye kanaler til Kanalregisteret.
Risiko				Mest risiko i forhold til ukjent omfang på oppgaver. Mangler kapasitet på å sjekke omfang.

Økonomistatus

AKKUMULERT BUDSJETT OG REGNSKAP

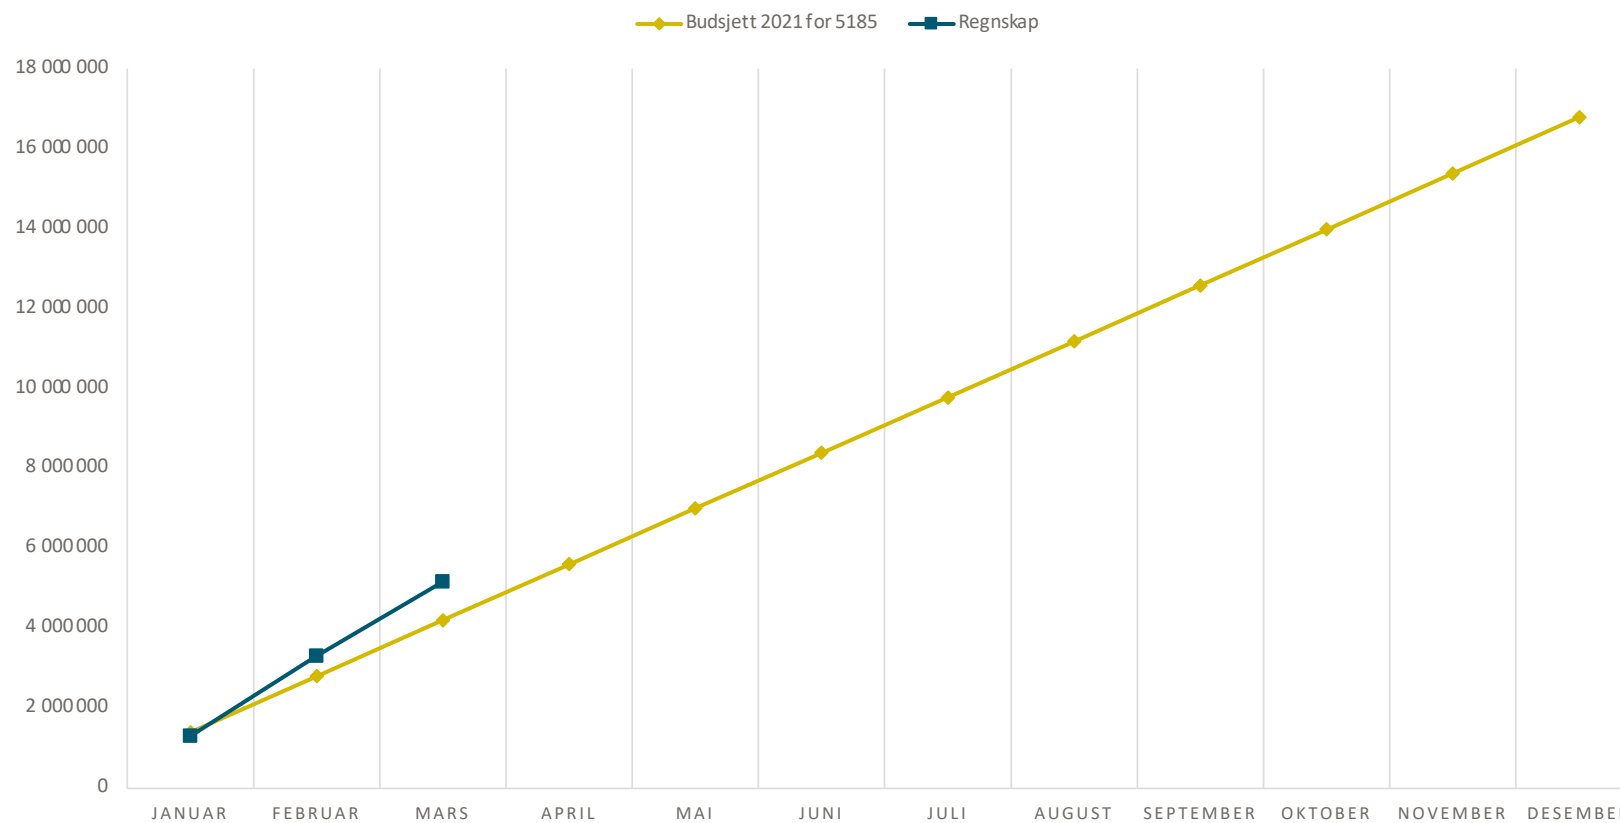

Risikovurdering

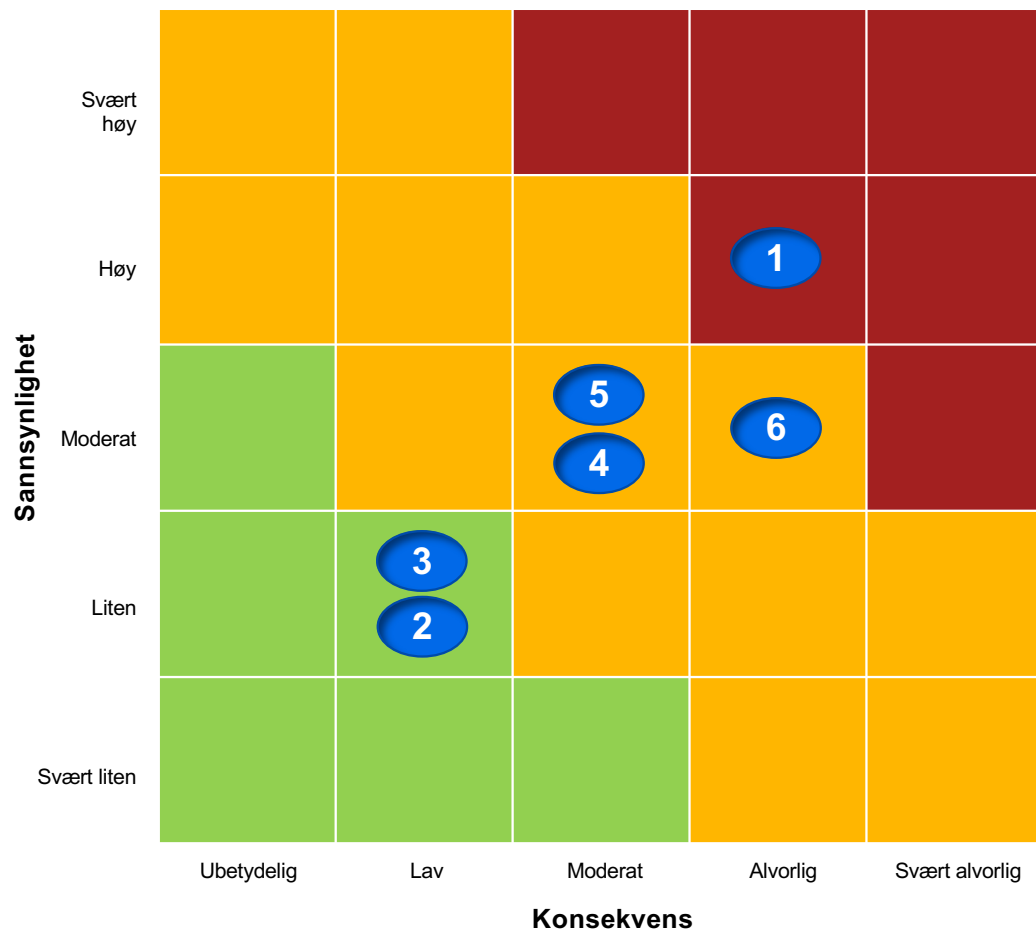

	Risikoelementer	Tiltak
1	For liten kapasitet på produkteierene	Avlaste produkteierene fra annet arbeid. Involvere Seksjon for forskningsstøtte i utredningsarbeid.
2	Overgang til ny kilde for masterdata for person	Avklaring, involvere Cristin-utviklere og arkitekt-gruppen
3	Omfang på migrering av Cristin-resultat	Avklaringer, innvolvere Cristin databaseutviklere og arkitektgruppen
4	Omfang på omskriving av Sentralimport	Avklaringer. Mulighet for å benytte Cristin-utviklere
5	Definering av ny NVI-prosess	Tett oppfølging av utredningen
6	Omfang på tilgjengeliggjøring av statistikk (DUCT, Låt, osv)	Jobbe tett med Seksjon for forskningsstøtte.
7		
8		
9		
10		



Leveranseoversikt – Fase 5 : 01.01.2021 – 31.06.2021

Leveranse	% fullført	Forfallsdato	Kommentar
Strategi for migrering av Cristin-resultater	70	01.05.2021	Finn ut hvordan man ønsker å få data ut fra Cristin (teknologi og format), finn ut hvordan man ønsker å importere inn i NVA (teknologi). Lag enkel proof-of-concept
Utrede og forankre ny NVI-prosess	60	01.05.2021	Start arbeidet med å definere en forenkling av dagens NVI-prosess for godkjenning
Innmelding og behandling av brukerstøtte	100	12.03.2021	Lag skjermbilder for Registrator og Kurator for innmelding og behandling av brukerstøtte
Støtte for å hente metadata fra andre lenker enn DOI	90	12.03.2021	Lag støtte for å hente metadata basert på Dublin Core, Open Graph og Highwire. Vurder andre formater
Start på arbeidet med ekstern API-tjeneste	40	01.04.2021	Finn ut hvordan man ønsker å tilby et eksternt API, forbedre dokumentasjon av tjenestene, tildeling av API-nøkler
Støtte for registreringstyper fra Cristin	70	01.05.2021	Lage skjermbilder for alle registreringstyper som man ønsker å migrere fra Cristin
Opprette og endre prosjekt	10	15.04.2021	Lag skjermbilder for å opprette og endre prosjekt . Bruk Cristin sitt prosjekt-API
Ta i bruk Cristin-personregister	20	01.05.2021	Ta i bruk Cristin sitt personregister for personer og forfattere
Skjermbilder for personhåndtering	0	01.06.2021	Lag skjermbilder for å håndtere personer som skal ha tilgang til innlogging og forfatterregisteret. Dette er skjermbilder som finnes i dagens Cristin-løsning
Importer studentoppgaver	0	15.05.2021	Sette opp API i NVA og lag program for å få inn studentoppgaver fra sensursystem
Støtte flere måter å logge på	0	01.06.2021	Støtt flere måter å logge på enn Feide. Vurder mulighet for HelseID, videreføring av dagens brukernavn/passord i Cristin
Støtte for forskningsdata	0	15.06.2021	Støtte for registrering av statisk forskningsdata
Metadata for indeksering	0	15.06.2021	Tilrettelegge metadata slik at crawler ala Google finner innholdet
Sherpa/Romeo integrasjon	0	31.06.2021	Vise Sherpa/Romeo data for tidsskrifter og utgiver i forhold til lisens
Utrede ny forretningsmodell NVA	0	31.06.2021	Finne ut hvordan man ønsker å brukerfinansiere NVA. Se på muligheter i AWS

Overordnede mål 2021

- Revidere dagens NVI prosess
- NVI rapportering i NVA for 2021 publikasjoner
- Publikasjoner fra Cristin og Brage er migrert til NVA
- Registrering av resultat i Cristin stoppes
- Brage-arkiv som er migrert legges ned
- Cristin API skal fortsatt fungere mot NVA API
- Prioritert Cristin-funksjonalitet flyttes til sky
- Støtte for forskningsdata som publikasjonstype
- Brukere av Cristin og Brage tar i bruk ny skybasert løsning. Starte på nedleggelse av Cristin og Brage.
- **Nytt navn på NVA! Dekke både Cris og Arkiv.**



