

Nasjonalt Vitenarkiv Styringsgruppemøte

31.08.2021


Terje Hellesvik



Prosjektnavn:	Nasjonalt Vitenarkiv (NVA)	Oppsummering		
Ansvarlig virksomhet:	Unit	Prosjektet kjører pilot med minimumsfunksjonalitet. Det er foreløpig en kunde som har lagt inn publikasjoner i produksjon. Prosjektet kan ikke ta inn nye institusjoner før nytt personregister er på plass. Det er opprettet en ekstern testgruppe (vår referansegruppe) som har tilgang til en testinstans. Prosjektet har fått på plass automatisk bygging og utrulling (DevOps). Det jobbes med ny funksjonalitet som vil bli rullet ut fortløpende.		
Prosjekteier:	Frode Arntsen			
Prosjektleder:	Terje Hellesvik			
Rapportdato	31.08.2021			
	Forrige	Nå	Trend	Områdestatus
Fremdrift				Det er fortsatt uklart om hvor mye jobb som skal gjøres på Sentralimport. Planen var at Sentralimport skulle skrive til NVA istedenfor Cristin. Det kan se ut som det er ønsker om å endre prosess også. NVA har tatt i bruk Bare som personregister. Det er ønsker om å ta i bruk Cristin sitt personregister. Dette vil påvirke framdrift. Generell lav framdrift.
Økonomi				Prosjektet har til sammen 17 millioner for å ferdigstille prosjektet i 2021. Regnskapet viser høyere forbruk enn opprinnelig budsjett. Det er ønske om å ta igjen noe forsinkelse tidlig i året.
Ressurser				Prosjektet sitter nå med et utviklingsteam med variabel kompetanse som må utvikles videre for å sikre gode leveranser.
Kvalitet				Det er avsatt en egen ressurs til å jobbe med automatiske tester. Alle tester kjører nå i sky. Det lages en testrapport som følges opp daglig. Det er kun en kunde i produksjon og ikke meldt om problemer.
Avhengigheter				Masterdatakilder for prosjekt, person og organisasjon blir ikke ferdig i år. NVA blir avhengig av prosjekt, person, organisasjon som det ligger i Cristin-databasen. Avhengig av Kanalregisteret. De mangler fortsatt muligheter for å melde inn nye kanaler til Kanalregisteret.
Risiko				Risiko i forhold til ukjent omfang på oppgaver. Mangler kapasitet på å sjekke omfang. Noe mangelfulle kompetanse/erfaring i utviklingsteamet for å få full hastighet.

Økonomistatus

AKKUMULERT BUDSJETT OG REGNSKAP

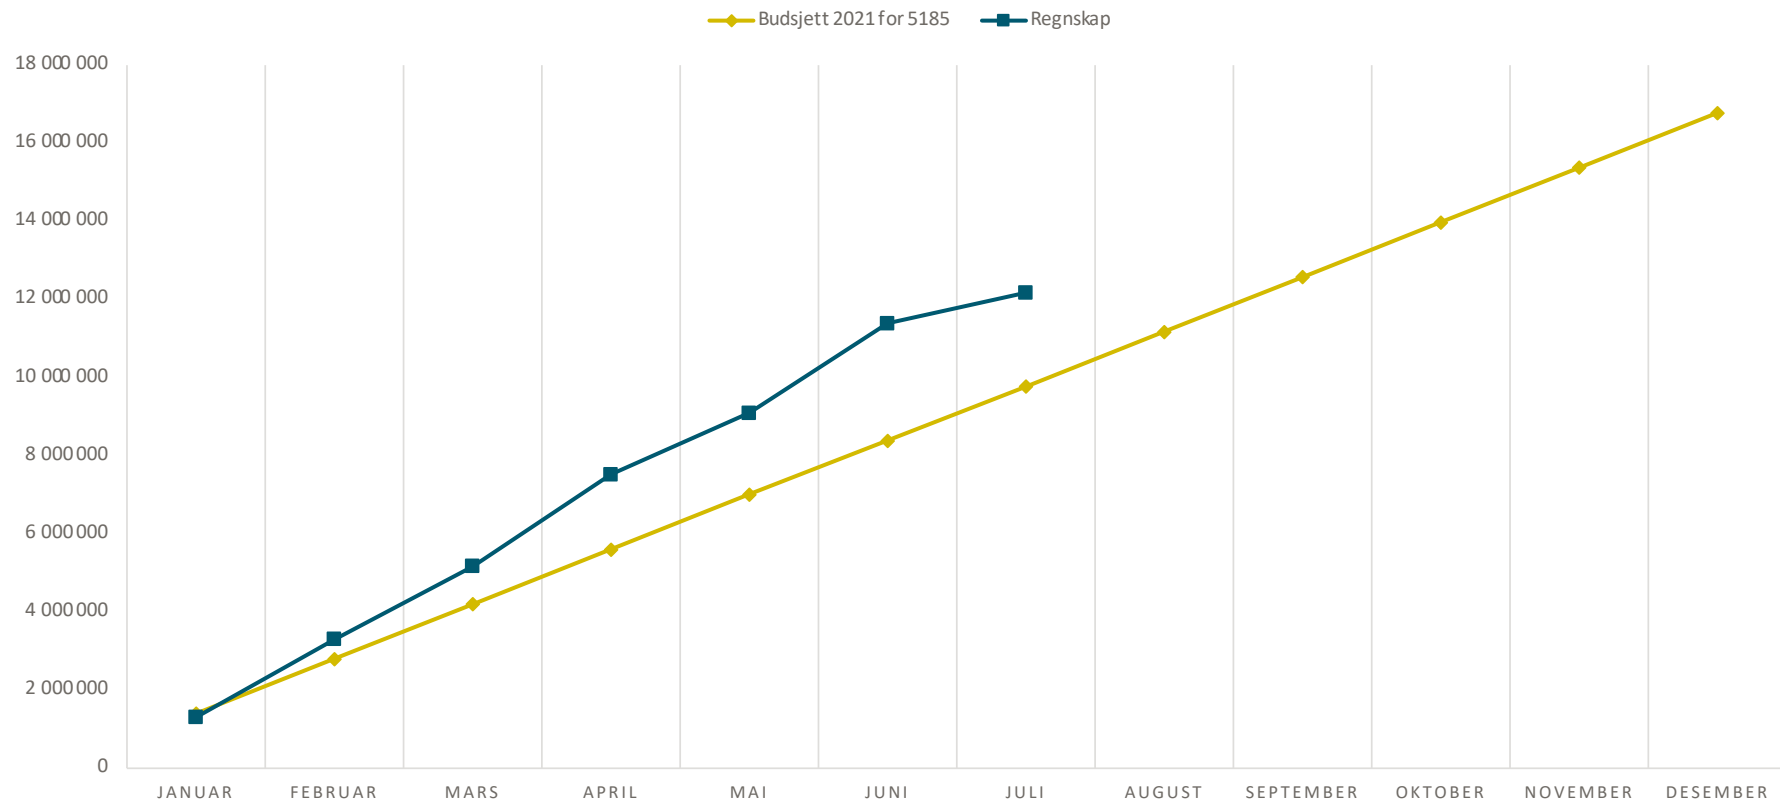

Risikovurdering

Sannsynlighet	Svært høy					
	Høy			7 1		
	Moderat		5	4 8		
	Liten		6 3			
	Svært liten			2		
		Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
		Konsekvens				

	Risikoelementer	Tiltak
1	For liten kapasitet på produkteierne	Avlaste produkteierne fra annet arbeid. Involvere Seksjon for forskningsstøtte i utredningsarbeid.
2	Ikke mulig å registrere brukere/forfatter i CRIS/NVA	Få hjelp av Seksjon for forskningsstøtte til å definere prosess for personhåndtering i CRIS/NVA. Finne personer fra Cristin-miljøet som kan hjelpe til å implementere API'er for ny prosess.
3	Kvalitet og omfang på migrering av Cristin-resultat	Avklaringer, involvere Cristin databaseutviklere og arkitektgruppen. Gjør proof-of-concept
4	Forsinkelser i implementasjon av Sentralimport i CRIS/NVA	Utrede, justere eller nyutvikle løsning for import av publikasjonsdata
5	Ny NVI-prosess blir ikke avklart tidlig nok	Tett oppfølging av utredningen. Utrede mulige alternativer til full NVI prosess
6	DUCT/Tableau får ikke de riktige data fra CRIS/NVA	Jobbe tett med Seksjon for forskningsstøtte. Gjør enkel proof-of-concept
7	Manglende framdrift på utvikling	Se på kompetansetiltak. Gjør endringer i arbeidsprosesser.
8	Cristin-API slutter å fungere for utlesing av resultat	Avklare omfang med Tech-lead.

Leveranseoversikt – Fase 5 : 01.01.2021 – 15.07.2021

Leveranse	% fullført	Forfallsdato	Kommentar
Strategi for migrering av Cristin-resultater	100	01.05.2021	Finn ut hvordan man ønsker å få data ut fra Cristin (teknologi og format), finn ut hvordan man ønsker å importere inn i NVA (teknologi). Lag enkel proof-of-concept
Utrede og forankre ny NVI-prosess	100	15.07.2021	Start arbeidet med å definere en forenkling av dagens NVI-prosess for godkjenning
Støtte for å hente metadata fra andre lenker enn DOI	100	15.07.2021	Lag støtte for å hente metadata basert på Dublin Core, Open Graph og Highwire. Vurder andre formater
Støtte for registreringstyper fra Cristin	70	15.07.2021	Lage skjermbilder for alle registreringstyper som man ønsker å migrere fra Cristin
Opprette og endre prosjekt	10	01.09.2021	Lag skjermbilder for å opprette og endre prosjekt . Bruk Cristin sitt prosjekt-API
Ta i bruk Cristin-personregister	20	01.09.2021	Ta i bruk Cristin sitt personregister for personer og forfattere
Skjermbilder for personhåndtering	30	01.09.2021	Lag skjermbilder for å håndtere personer som skal ha tilgang til innlogging og forfatterregisteret. Dette er skjermbilder som finnes i dagens Cristin-løsning
Støtte flere måter å logge på	0	01.09.2021	Støtt flere måter å logge på enn Feide. Vurder mulighet for HelseID, videreføring av dagens brukernavn/passord i Cristin
Proof-of-concept: Utveksling av data med Tableau	100	31.06.2021	Teste overføring av data fra NVA til Tableau.
Kunstnerisk utviklingsarbeid	20	01.11.2021	Tett dialog med UHR for å lage støtte for kunstnerisk resultat
Migrering av Cristin-resultat	70	01.06.2022	Migrere alle resultater man ønsker å videreføre til NVA
Proof-of-concept: Helsevisningsportalen	100	01.06.2021	Samme funksjonalitet som i Cristin. Ta i bruk endepunkter som brukes i dag.

Leveranseoversikt – Fase 6 : 17.07.2021 – 31.12.2021

Leveranse	% fullført	Forfallsdato	Kommentar
Ta i bruk Cristin-personregister	20	15.10.2021	Ta i bruk Cristin sitt personregister for personer og forfattere
Håndtering av personer	10	15.11.2021	Lag skjermbilder for å håndtere personer som skal ha tilgang til innlogging og forfatterregisteret. Dette er skjermbilder som finnes i dagens Cristin-løsning
Støtte flere måter å logge på	20	15.10.2021	Støtt flere måter å logge på enn Feide. Vurder mulighet for HelseID, videreføring av dagens brukernavn/passord i Cristin
Støtte for registreringstyper fra Cristin	70	01.11.2021	Lage skjermbilder for alle registreringstyper som man ønsker å migrere fra Cristin
Opprette og endre prosjekt	10	01.10.2021	Lag skjermbilder for å opprette og endre prosjekt. Bruk Cristin sitt prosjekt-API
Støtte for forskningsdata	10	01.11.2021	Støtte for registrering av statisk forskningsdata
Metadata for indeksering	0	01.11.2021	Tilrettelegge metadata slik at crawler ala Google finner innholdet
Sherpa/Romeo integrasjon	0	01.12.2021	Vise Sherpa/Romeo data for tidsskrifter og utgiver i forhold til lisens
Forbedre søk	10	01.12.2021	Lag mulighet for enkle søkefasetter
Tilby ekstern API-tjeneste	0	31.12.2021	Tilby API for søk og uthenting av resultat, dokumentasjon av tjenesten, tildeling av API-nøkler
Kunstnerisk utviklingsarbeid	20	31.12.2021	Lage skjermbilder for Kunstnerisk utviklingsarbeid
Migrer Cristin-resultater til ny løsning	70	01.06.2022	Migrere resultater fra Cristin sine registreringstyper til NVA sine registreringstyper

