

Nasjonalt Vitenarkiv Styringsgruppemøte

15.10.2020


Terje Hellesvik




Prosjektnavn:	Nasjonalt Vitenarkiv (NVA)	Oppsummering		
Ansvarlig virksomhet:	Unit	Prosjektet kjører pilot med minimumsfunksjonalitet. Det er foreløpig en kunde som har lagt inn publikasjoner i produksjon. Prosjektet jobber med en prioritert liste over institusjoner som skal bli kunder. Det er opprettet en ekstern testgruppe (vår referansegruppe) som har tilgang til en testinstans. Prosjektet har fått på plass automatisk bygging og utrulling (DevOps). Det jobbes med ny funksjonalitet som vil bli rullet ut fortløpende. I henhold til prosjektplanen ligger vi etter tidsplan. Det er satt inn tiltak for å prøve å ta igjen noe av dette (nye ressurser, endring i arbeidsprosess).		
Prosjekteier:	Frode Arntsen			
Prosjektleder:	Terje Hellesvik			
Rapportdato	07.10.2020			
	Forrige	Nå	Trend	Områdestatus
Fremdrift				I henhold til prosjektplanen ligger vi etter tidsplan. Det er satt inn tiltak for å prøve å ta igjen noe av dette (nye ressurser, endring i arbeidsprosess).
Økonomi				Prosjektet fikk tilført 11 MNOK i Revidert Nasjonalbudsjett 2020. Disse midlene kommer ikke til å bli brukt opp 100% i inneværende år. Det er foreslått tildelt ytterligere 10 MNOK for 2021 for ferdigstilling av prosjektet.
Ressurser				Prosjektet har ønsket seg ressurser fra Oslo og da spesielt Cristin-miljøet. Dette ønsket har ikke blitt imøtekommet. Det har vært en del utskifting av ressurser. Prosjektet sitter nå med et stabilt utviklingsteam med riktig kompetanse.
Kvalitet				Det er avsatt en egen ressurs til å jobbe med automatiske tester. Foreløpig testes kode som skal i produksjon manuelt. Det er kun en kunde i produksjon og ikke meldt om problemer.
Avhengigheter				Prosjektet må avgi ressurser til Masterdatakilder. Dette gir negativ innflytelse på egen framdrift, men NVA er avhengig av Masterdatakilder for å ferdigstilles.
Risiko				Fortsatt lavere framdrift enn ønsket.

Økonomistatus

AKKUMULERT BUDSJETT OG REGNSKAP

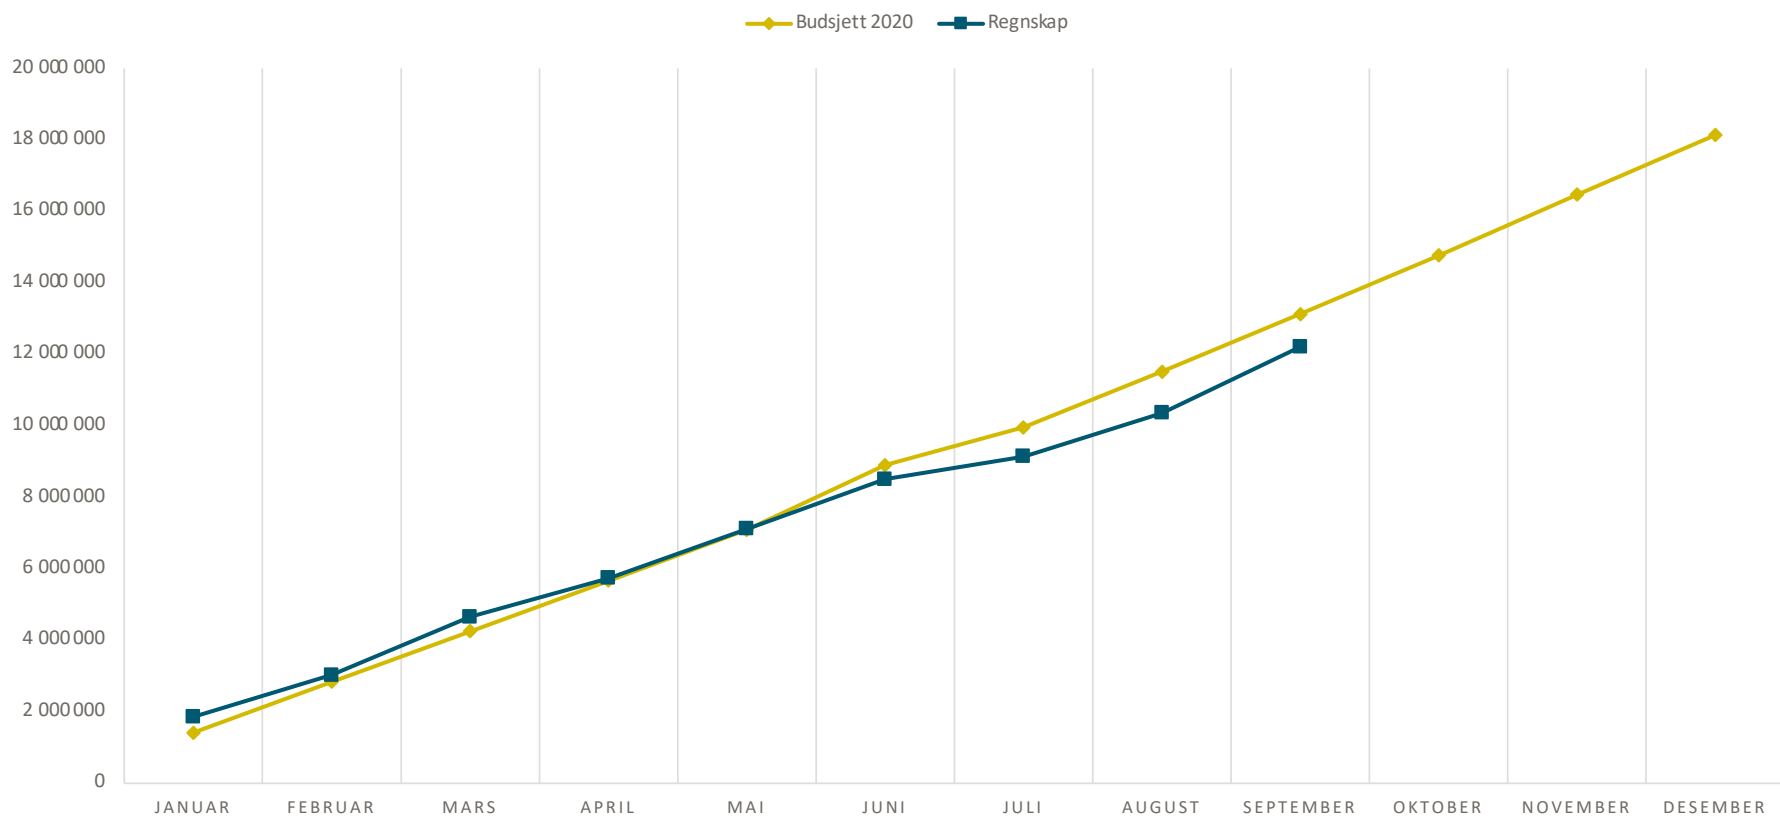

Risikovurdering

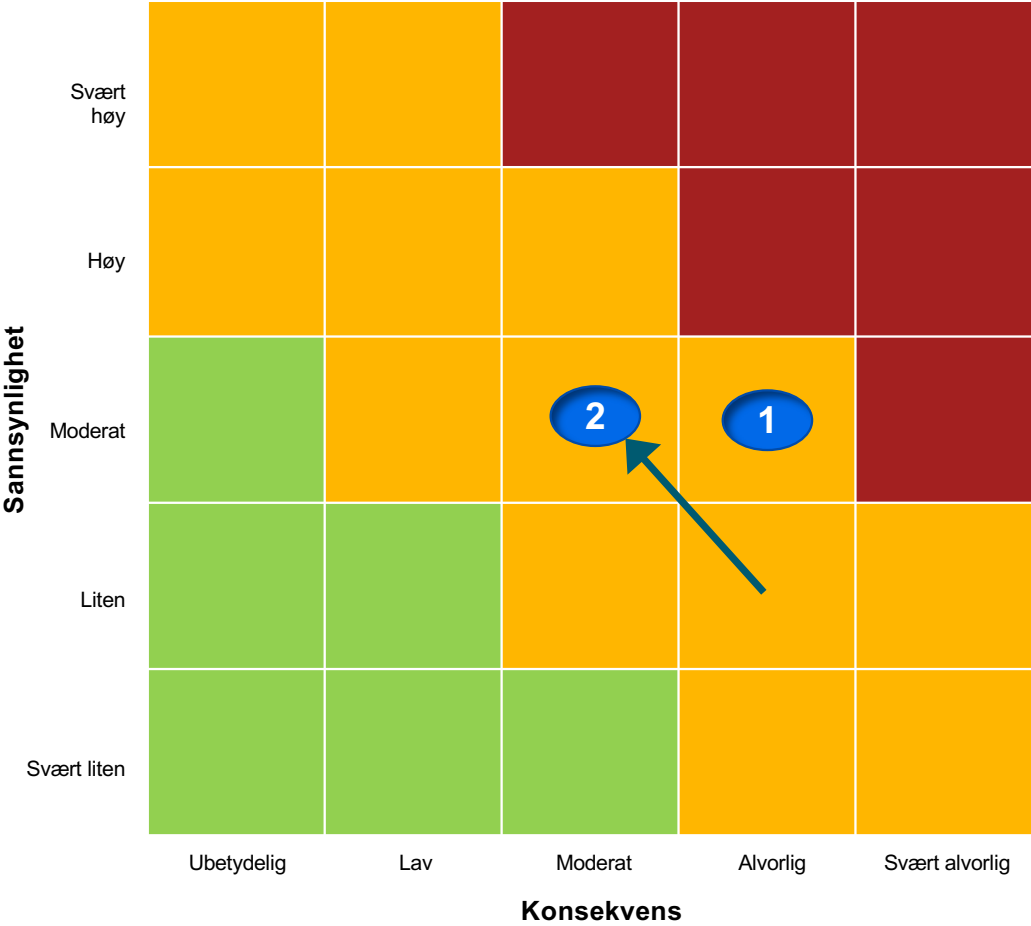

	Risikoelementer	Tiltak
1	Lav framdrift	Endre arbeidsprosess
2	Beholde egne ressurser	Skjerme, avklare internt
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Leveranseoversikt

Leveranse	% fullført	Forfallsdato	Kommentar
Oppfølging av pilotkunder / testkunder	50	31.12.2020	Pilotkunder: Fjellhaug og HL-senteret. Oppfølging av HL-senteret uke 42/43/44 Referansegruppe: NTNU, Sintef, Nina, BI, UiO, Oslo Met, UiB. Planlagte aktiviteter uke 42/43/44
Støtte alle registreringstyper for å kunne importere fra Brage	40	01.12.2020	Støtter nå: Publikasjon i tidsskrift, bokpublikasjon, rapport, studentoppgave Jobbes med: Annen publikasjon, presentasjon, annet resultat Under planlegging: Metadata for forskningsdata via DOI-referanse
Administrasjonsskjermbilder		31.12.2020	Kurator: støtter arbeidsflyt for utstedelse av DOI (ikke selve utstedelsen), jobbes med brukersupport, godkjenning av publikasjoner Administrator: støtter endring av data om egen institusjon, tildeling av roller Redaktør: Avklares med referansegruppen
Støtte nok metadata til at det er mulig å gjøre NVI-rapportering for 2021 og videre	80	31.12.2020	Pågående diskusjon med Cristin-miljøet.
Opprette DOI	60	31.12.2020	Jobbes med nå
Hente publikasjoner fra ORCID	0	31.12.2020	
Skrive publikasjoner til ORCID	0	31.12.2020	
Start på program for Brage-migrering	0	31.12.2020	
Innmelding og behandling av brukerstøtte i NVA	0	31.12.2020	
Importere studentoppgaver fra eksamen- og sensursystem (Inspera)	0	31.12.2020	



